



# Opération de développement des capacités d'accueil du QUAI PETIT COURONNE

Interface travaux HAROPA PORT et exploitation du  
quai par SURVEYFERT et GROUPE BZ



# Calendrier des travaux sur QPC

Travaux menés par HAROPA PORT	Dates
Allongement et adaptation des équipements du QPC aval : B18 à B32	11/23 à 07/24
Dragage aval	07/24 à 9/24
Rempiètement et adaptation des équipements du QPC amont : B01 à B18	07/24 à 12/25
Dragage du rempliement	fin 01/26

Travaux menés par Groupe BZ	Dates
Nouveau portique et création d'une passerelle (convoyeur) entre silo existant et nouveau portique	12/23 à 06/24
Nouveau silo	04/24 à 12/25

## Contraintes HAROPA PORT :

- Phasage à valider avec exploitants avant mi-octobre 2023 pour intégrer dans publicité candidatures marché travaux
- Programme à valider avec exploitants pour novembre 2023 (pièces marché travaux)



# PHASE 1-A : Novembre 2023 à fin Mai 2024

## HAROPA PORT :


- Fin travaux préparatoires TCMD amont : fin janvier 2024
- Travaux d'allongement et adaptation des équipements du QPC aval : B18 à B32
- **Besoin HAROPA PORT: voie d'accès bord à quai de 8 m + 2 zones de chantier (ZCH), Utilisation pontons de B12,5 à B18**

## Groupe BZ :

- Exploite le quai entre B01 à B09
- Construction d'un nouveau portique de chargement : B09 à B12 ;
- Construction partielle des passerelles de chargement et réhabilitation voie de grue ;
- Avril 2024 : démarrage des fondations du nouveau silo à l'arrière du quai B09 à B18.

## SURVEYFERT

- Exploite le quai entre B21 et B31

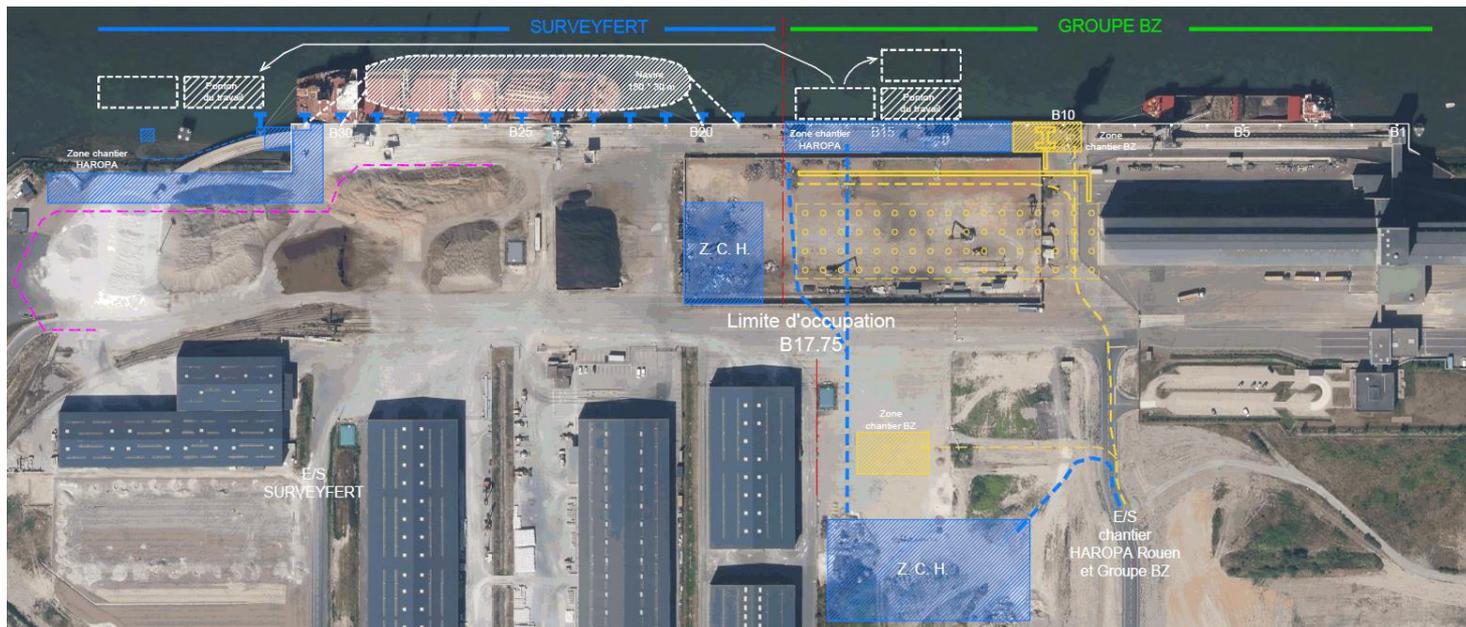

## DERICHEBOURG :

- Déménagement fin mars 2024

# PHASE 1-B : Juin 2024 à Juillet 2024

## HAROPA Rouen :


- Travaux d'allongement et Adaptation des équipements du QPC aval : B18 à B32
- Défenses flottantes B08 à B18
- **Besoin HAROPA : voie d'accès bord à quai de 8 m, 2 zones de chantier (ZCH) et stockage de 30 m en aval du B 29**

## Groupe BZ :

- Exploite le quai entre B01 à B18 (avec Panamax jusqu'au B19 ?)
- Mise en service du nouveau portique en Juin 2024;
- Construction du nouveau silo et des passerelles de chargement à l'arrière du quai B09 à B18.

## SURVEYFERT

- Exploite le quai entre B21 et B31

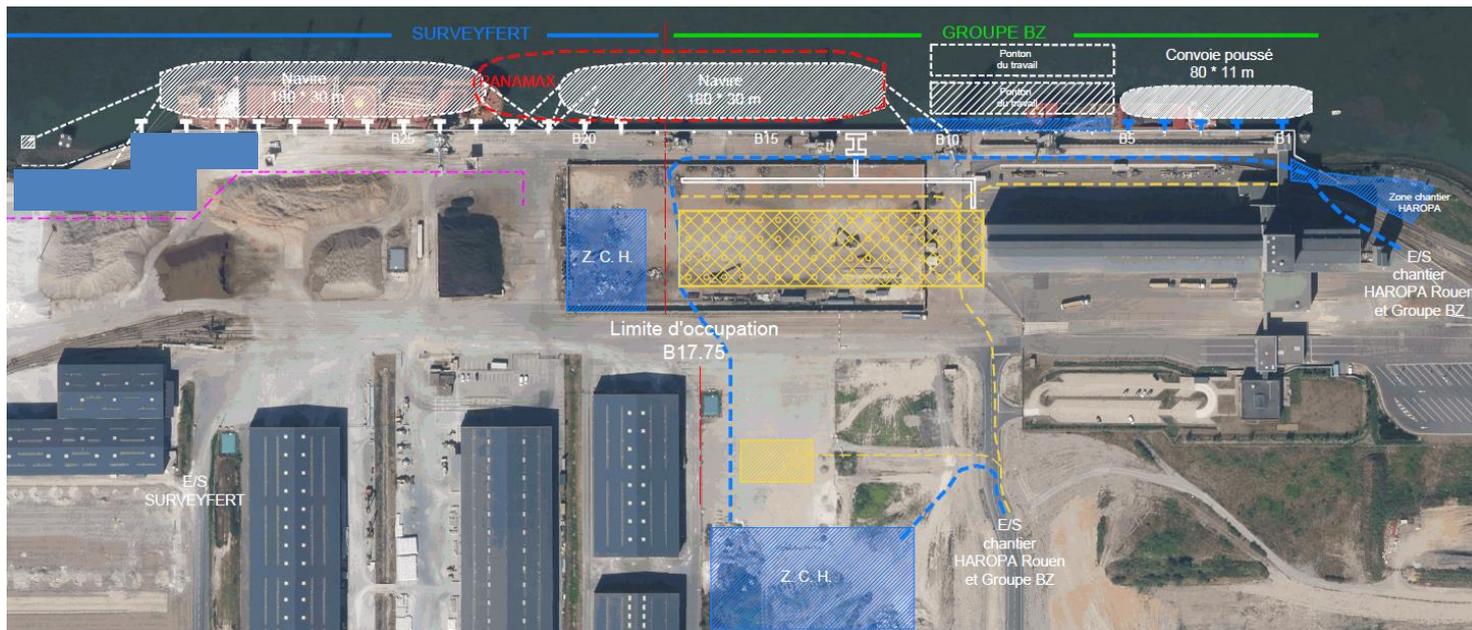

# PHASE 2-A : Juillet 2024 à Mai 2025

## HAROPA Rouen :


- Dragage aval (fini fin septembre 24)
- Pose des nouveaux bollards et boucliers d'accostage : B01 à B05
- 2 Défenses flottantes : B08 à B18
- Rempiètement du B5,5 à B8,5
- **Besoin HAROPA : voie d'accès bord à quai de 8 m, 2 zones de chantier (ZCH), Utilisation pontons de B5,5 à B8,5**

## Groupe BZ :

- Exploite le quai entre :
  - ✓ B01 à B05
  - ✓ B10 à B20
- **Panamax jusqu'au B22 ?**
- Mise en service du nouveau portique ;
- Constructions du nouveau silo et des passerelles

## SURVEYFERT

- Exploite le quai entre B21 et B32
- (totalement après septembre 24)

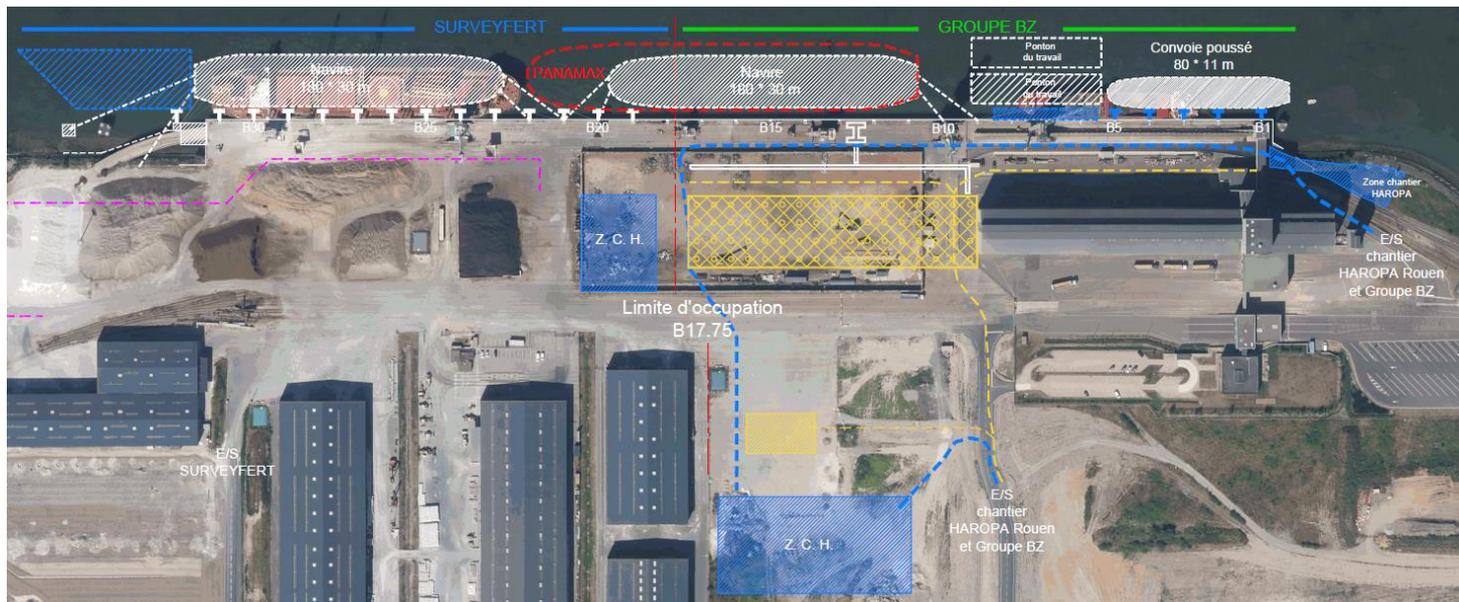



# PHASE 3 : Juillet 2025 à Décembre 2025

## HAROPA Rouen :


- Dragage partiel du rempiètement B6 à B18;
- Rempiètement du B11 à B18
- **Besoin HAROPA :** voie d'accès bord à quai de 8 m, 2 zones de chantier (ZCH), Utilisation pontons de B11 à B21

## Groupe BZ :

- Exploite le quai entre B01 à B10
- Constructions du nouveau silo
- **Pas de Panamax**

## SURVEYFERT

- Exploite le quai entre B21 et B32

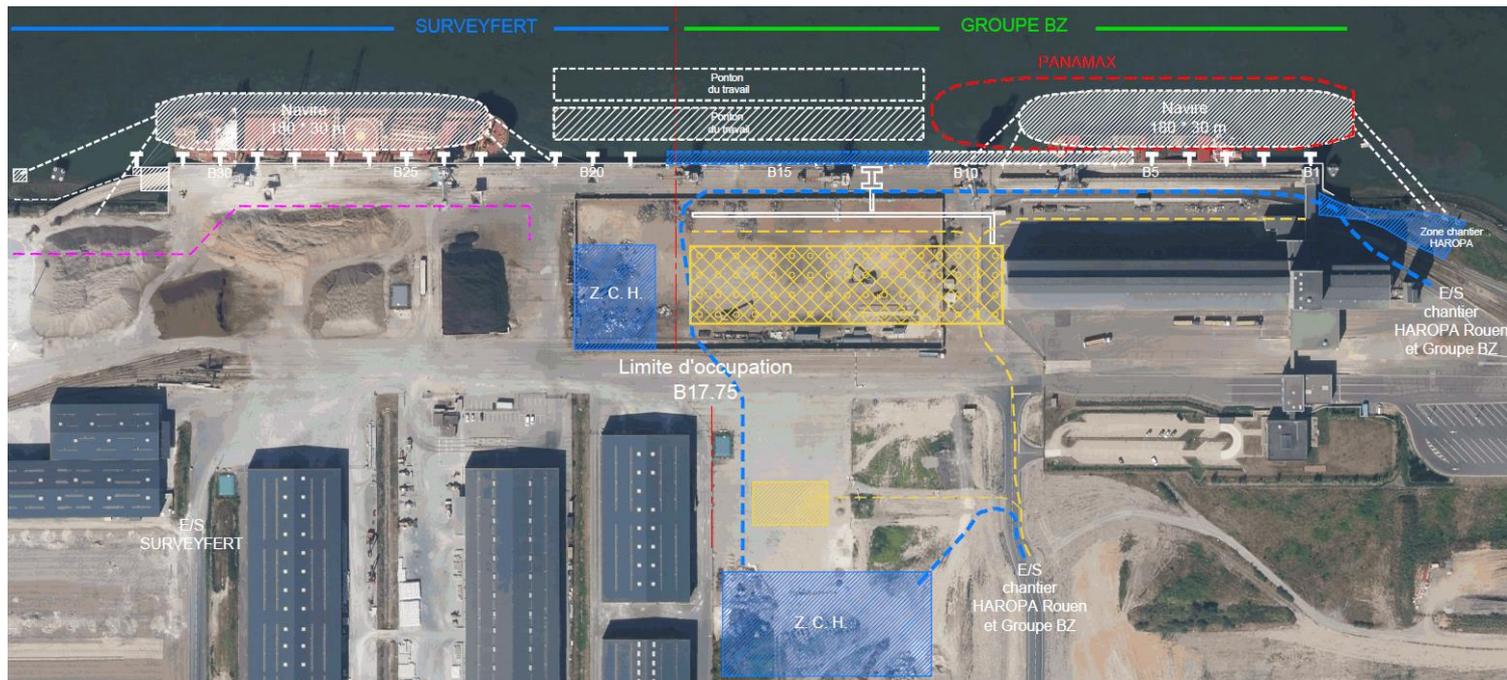

# PHASE 4 : Janvier 2026

## HAROPA Rouen :


- Dragage rempiètement bord à quai en parallèle de l'exploitation

## Groupe BZ :

- Exploite le quai entre B01 à B17,75

## SURVEYFERT

- Exploite le quai entre B17,75 et B32

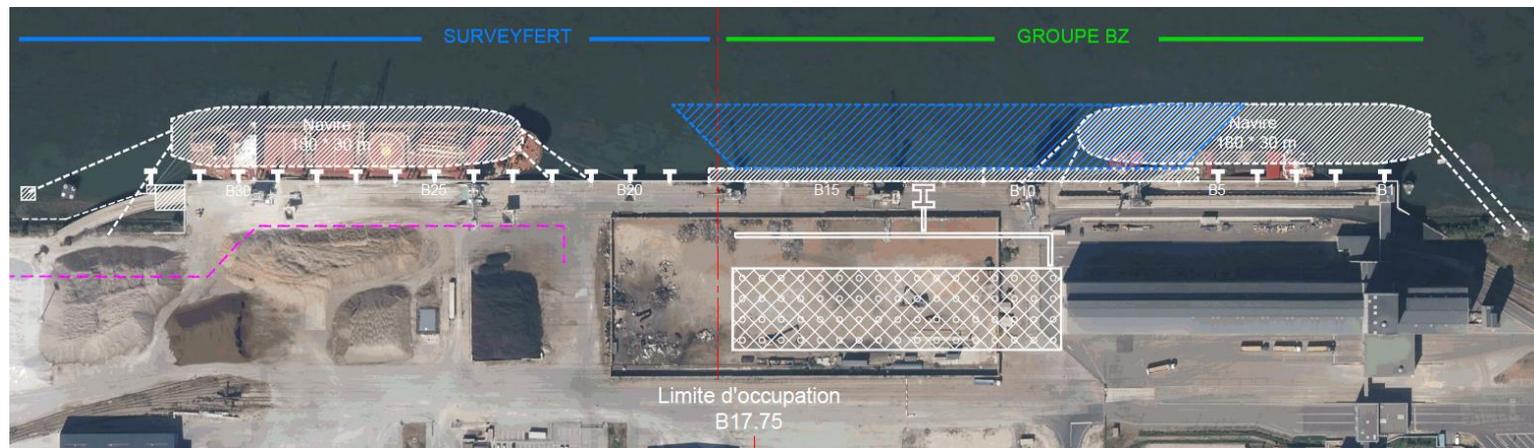

## Points à aborder

- A) Position des zones d'installation de chantier et accès des entreprises de travaux pendant l'exécution de juillet 2024 à décembre 2025 ( phases 2A ,2B et 3)
- B) Occupation du front d'accostage (ex Derichebourg) par BZ de juillet 2024 à juin 2025 ( phases 2 A et 2 B)
- C) Possibilité d'exploiter des Panamax sur l'actuel convention Surveyfert de Juillet 2024 à juin 2025
- D) Possibilité d'exploiter l'extension de la convention Surveyfert dès mai 2024 par Surveyfert
